

CO₂



Haavoittuva monimuotoisuus

Ilmastonmuutos ja Luontokato

Luontoliiton kouluvierailuhanke

CO₂



KORJAAMO

LAINAAMO



Lyhyesti

- Hankkeessa suunniteltiin ja tuotettiin nuorille suunnattua kasvatusmateriaalia ilmastonmuutoksen ja luontokadon välisestä suhteesta
 - tuotettiin neljä aiheeseen liittyvää videota
 - Kehitettiin ja pilotoitiin aiheen pohjalta uusi kouluvierailukonsepti



Hankehakemus
(ensimmäinen versio v.
2020, ei myönnetty)

Hanke hyväksytään, aloitusta
siirretään
(käynnissä VieKas-hanke)

Hanke käynnistyy

- Ideointiryhmä ja ohjausryhmä työstävät materiaaleja
- Videotuotanto ja kouluvierailumateriaali
- Vierailut alkavat 10/2023

Vierailut käynnissä kevään
2024 ajan

Kevään päätteeksi
materiaalin kehityspäivä
vierailijoiden kanssa

Kehitys ja raportointi

Jatkorahoitus ELYltä
7/24-12/25. Vierailut
jatkuvat syksyllä 2024.

Vierailut jatkuvat
jatkorahoituksella

2021

2022

2023

2024

2025



Teemat

- Ilmastonmuutos ja luontokato
- Toiveikkaammat tulevaisuudenkuvat
- Ympäristötunteet
- Ympäristövaikuttaminen.



Tavoitteet

- Tarjotaan opettajille tukea ilmastokasvatukseen
- Edistetään nuorten hyvinvointia vastaamalla nuorten kasvaneeseen huoleen, epävarmuuteen ja turvattomuuteen, jotka liittyvät ilmastomuutokseen ja tulevaisuuteen
- Tuodaan toivoa – kehityksen suunta voidaan muuttaa!
- Keskitytään ratkaisukeskeisyyteen, ohjataan aktiiviseen toimintaan ja luodaan nuorille uusia, toiveikkaampia kestäviä tulevaisuudenkuvia



Kouluvierailumateriaali

- 2 x 90-minuuttinen diamateriaali
- Toiminnallisia tehtäviä myös opettajien vapaaseen käyttöön
- Saatavilla mappa.fi-palvelussa



Videot



Kouluvierailujen pilotointi

- Kouluvierailuja pilotoitiin **41 kertaa** (tavoitteena 60 kpl)
 - 24 eri ryhmää
 - 11 peruskouluvierailua
 - 12 ammattikouluvierailua
 - 16 lukiovierailua
 - 2 nuorten vapaa-ajan ryhmää
 - 4 etävierailua, 37 lähivierailua
- Vierailijat Tampereelta, Helsingistä ja Jyväskylästä.
- Kaupunkeina Lempäälä, Kemi, Tampere, Jyväskylä, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tuusula

Miksi määrätavoitetta ei saavutettu?

- Haasteena oli syksyllä 2023 **materiaalin valmistumisessa pieni viivästyminen**: vierailut päästiin aloittamaan lokakuussa aiotun elokuun sijaan.
- Tasapainottelu kouluilta tulleen kysynnän ja vierailijoiden alueellisen tasa-arvon kanssa haastavaa.
- Peruutuksia tuli paljon vasta huhti-toukokuussa 2024. Koordinaattori ollut näistä tietoinen – vierailijoille ei ollut korostettu, että **täytyisi heti ilmoittaa vierailun peruuntumisesta**.

Opettajien ja oppilaiden palautteet

- OPETTAJIEN PALAUTTEET

- 13 opettajalta palautetta
- Keskiarvo tasan 9, arvosanoja välillä 7-10
- Opettajat kehuivat erityisesti vierailijoita. Vierailujen rytmitys ja toiminnalliset tehtävät saivat myös kiitosta. Materiaali koettiin sekä toisella asteella että yläkouluissa sopivaksi.
- Opettajilta saatiin kehitysehdotuksia tehtävistä, toivottiin tarkempia ohjeistuksia ja ennakkotietoja, lisää toiminnallisuutta ja toisaalta lisää ja syvempää teoriaa.

"Toiminnallisuudesta iso plussa. Tehtävät olivat erittäin hyviä ja saivat selvästi opiskelijat pohtimaan asioita. "

"Täysi 10!"

- OPPILAIDEN PALAUTTEET

- 204 vastaajaa
- Yleisarvio kouluvierailusta 3,17/4
- Oppilaat tykkäsivät siitä, että vierailut tuovat tunneille vaihtelua ja kiittivät toiminnallisuutta
- Kehittämisen kohteita: osalle tuntui kertaukselta, toivottiin vielä lisää aktiivisia tehtäviä, tai aihe ei kiinnostanut lainkaan

"Tykkäsin todella paljon ja vierailut oli todella hyvin pidetty "

"Vierailu oli aika tylsä, en koe että siinä oli mitään hyötyä"

Hanke lukuina

KOULUVIERAILUT


- Järjestettyjä kouluvierailuja:
- erillisiä ryhmiä 24 (/30)
- vierailuja yhteensä 41 (/60)
- Kohdattuja nuoria: noin 400 erillistä nuorta, yhteensä noin 600 osallistujaa
- Kouluvierailijoita 4 + koordinaattori

HANKETYÖSKENTELEY

- Ohjausryhmässä 4 työntekijää + koordinaattori
- 7 vapaaehtoista idointiryhmäläistä

VIDEOT

- Julkaistu Luontoliiton someissa, Nuorten Luontomediassa ja kouluvierailumateriaalissa
- Markkinointi 200 €
- Kattavuus noin 43 800
- Kokonaan tai vähintään 15 sekuntia katsottu yli 11 100 kertaa
- Videoita tekemässä 8 vapaaehtoista nuorta

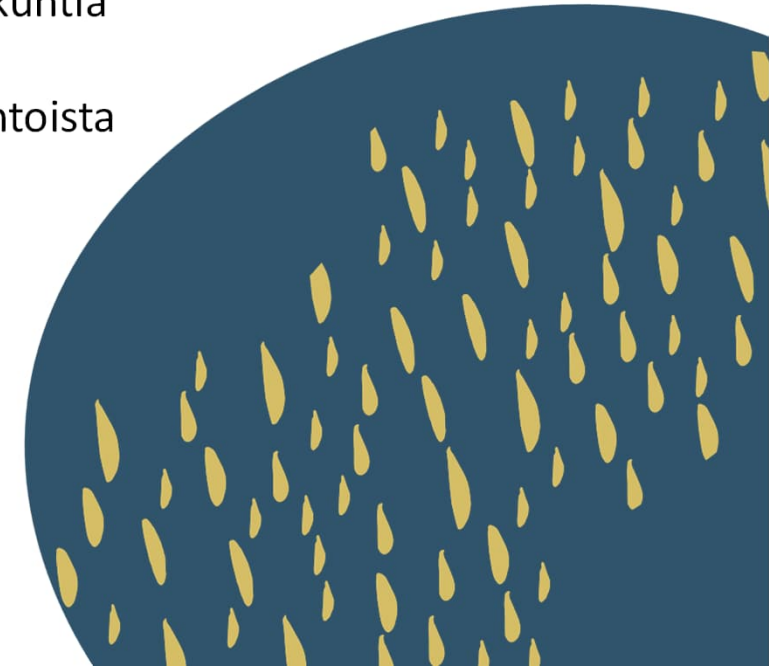

Jatkorahoituksen hankkiminen

- Vuoden 2023 ajan hankkeelle etsittiin aktiivisesti **yritysyhteistyökumppania**
 - lupaavia neuvotteluja käytiin, mutta sopimusta ei syntynyt
- Haettiin myös **hankerahoitusta** Nesslingin säätiöltä ja Riisissätiöltä
 - hakijamäärät suuria, hakemuksia ei hyväksytty
- Luontoliitto päätti jatkaa hanketta pienimuotoisella **omarahoituksella**, jos jatkorahoitusta ei olisi löytynyt
 - kouluvierailutoiminnan merkitys on Luontoliiton strategiassa suuri ja kehitetty materiaali laadukas
- **Jatkorahoitus** hankkeelle saatiin ELY-keskukselta 7/2024-12/2025.
- Pitkäaikaisen **rahoituksen etsintää jatketaan**
 - haasteena pitkäjänteisyys, hankerahoitukset ohjaavat uuden kehittämiseen



Hankehakemus
(ensimmäinen versio v.
2020, ei myönnetty)

Hanke hyväksytään, aloitusta
siirretään
(käynnissä VieKas-hanke)

Hanke käynnistyy

- Ideointiryhmä ja ohjausryhmä työstävät materiaaleja
- Videotuotanto ja kouluvierailumateriaali
- Vierailut alkavat 10/2023

Vierailut käynnissä kevään
2024 ajan

Kevään päätteeksi
materiaalin kehityspäivä
vierailijoiden kanssa

Kehitys ja raportointi

Jatkorahoitus ELYltä
7/24-12/25. Vierailut
jatkuvat syksyllä 2024.

Tavoitteena
300 uutta vierailua
2024-2025

2021

2022

2023

2024

2025





Kiitos!

Muutos lähtee pienestä.

www.luontoliitto.fi

@luontoliitto

